































	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		Lavorazioni edili - scav, f.e.p. caviddotti e tubazioni	14 days	06/01/14 8.00	23/01/14 17.00	
2		Lavorazioni edili, supporto , basamenti, tramezzi, vari	15 days	22/01/14 8.00	11/02/14 17.00	
3		dorsali idranti edificio "B" - rifAP.ta01	31 days	06/01/14 8.00	17/02/14 17.00	
4		dorsali idranti edificio "B" - rifAP.ta01	31 days	06/01/14 8.00	17/02/14 17.00	
5		dorsali idranti edificio "B" - rifAP.ta01	31 days	06/01/14 8.00	17/02/14 17.00	
6		derivazioni e componenti imp idranti Edif.B rif	9 days	18/02/14 8.00	28/02/14 17.00	
7		derivazioni e componenti imp idranti Edif.Brif	9 days	18/02/14 8.00	28/02/14 17.00	
8		derivazioni e componenti imp idranti Edif.B rif	9 days	18/02/14 8.00	28/02/14 17.00	
9		collettore idranti mandata Gruppo n.1 - colleg. edif. "B"	6 days	03/03/14 8.00	10/03/14 17.00	
10		dorsali idranti edificio "C" - rifAP.ta01	12 days	03/03/14 8.00	18/03/14 17.00	
11		dorsali + derivazioni e componenti imp idranti Edif.C rif	11 days	03/03/14 8.00	17/03/14 17.00	
12		dorsali + derivazioni e componenti imp idranti Edif.F rif	8 days	18/03/14 8.00	27/03/14 17.00	
13		dorsali + derivazioni e componenti imp idranti Edif.E rif	4 days	18/03/14 8.00	21/03/14 17.00	
14		dorsali + derivazioni e componenti imp idranti Lavanderia	4 days	22/03/14 8.00	27/03/14 17.00	
15		duplicaz, derivazioni e componenti imp idranti Edif.A rif	15 days	27/03/14 8.00	16/04/14 17.00	
16		duplicaz, derivazioni e componenti imp idranti Edif.A rif	15 days	27/03/14 8.00	16/04/14 17.00	
17		realizzazione locale gruppo pressurizza n. 2 - edile	8 days	18/02/14 8.00	27/02/14 17.00	
18		serbatoi gruppo pressurizza n. 2 - idrico	3 days	27/03/14 8.00	31/03/14 17.00	
19		locale gruppo pressurizza n. 2 - elettrico	11 days	10/03/14 8.00	24/03/14 17.00	
20		gruppo pressurizza n. 2 - idrico	15 days	10/03/14 8.00	28/03/14 17.00	
21		gruppo pressurizza n. 2 - Attivazione- idrico 2	5 days	01/04/14 8.00	07/04/14 17.00	
22		gruppo pressurizza n. 1 - adeguamento idrico	8 days	08/04/14 8.00	17/04/14 17.00	
23		attivazione gruppi e pre collaudo idranti	2 days	18/04/14 8.00	21/04/14 17.00	
24		collaudo	1 day	21/04/14 8.00	21/04/14 17.00	
25		realizzazione locali sistemi IG01 - edile	10 days	04/04/14 8.00	17/04/14 17.00	
26		sistemi antincendio automatici edif. B - idrici 1	22 days	17/04/14 8.00	16/05/14 17.00	
27		sistemi antincendio automatici edif. B - idrici 1	22 days	17/04/14 8.00	16/05/14 17.00	
28		sistemi antincendio automatici edif. C - idrici 2	11 days	19/05/14 8.00	02/06/14 17.00	
29		sistemi antincendio automatici edif. C - idrici 2	11 days	19/05/14 8.00	02/06/14 17.00	
30		sistemi antincendio automatici edif. B - elettrici 1	24 days	15/04/14 8.00	16/05/14 17.00	









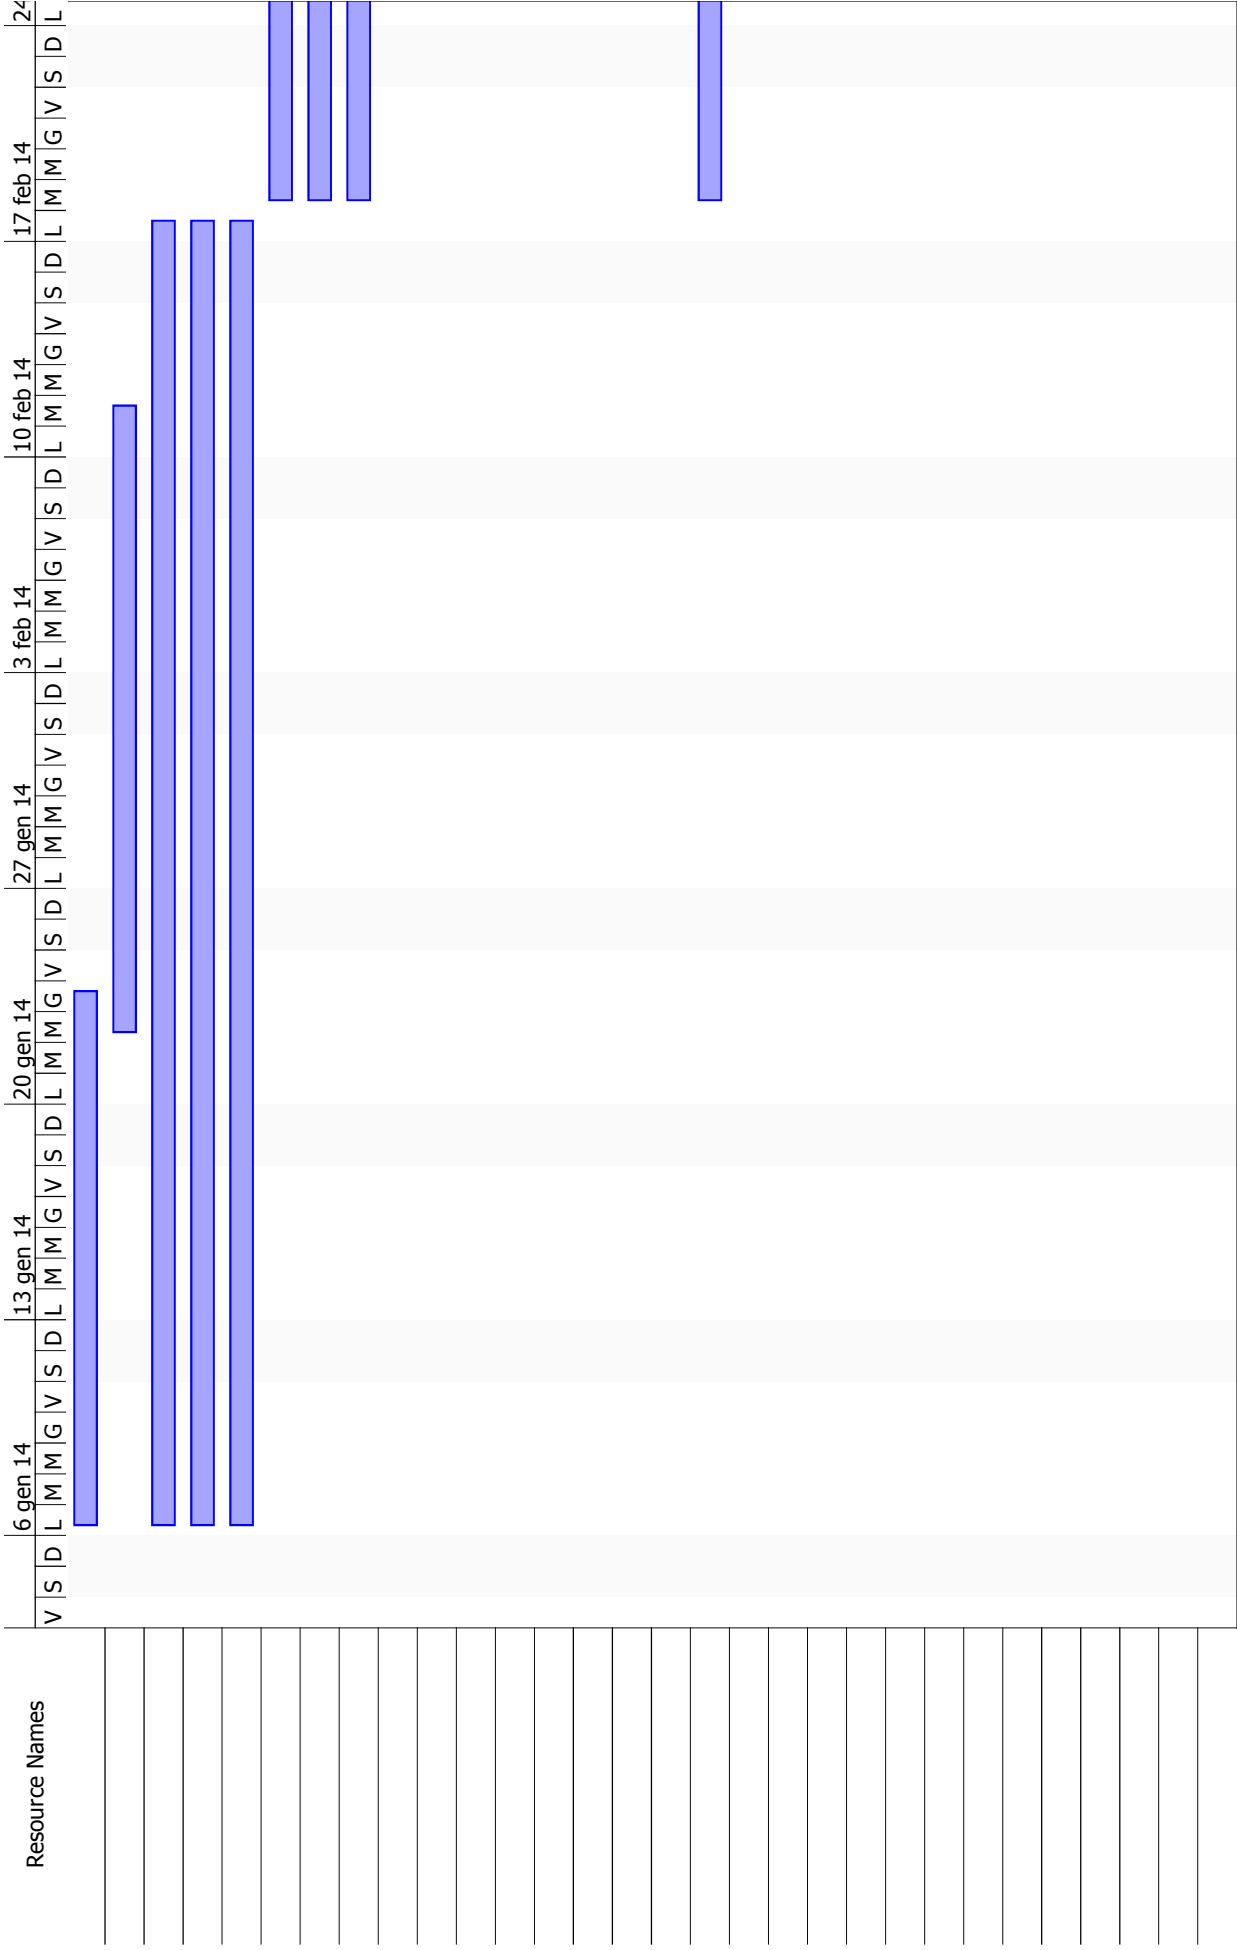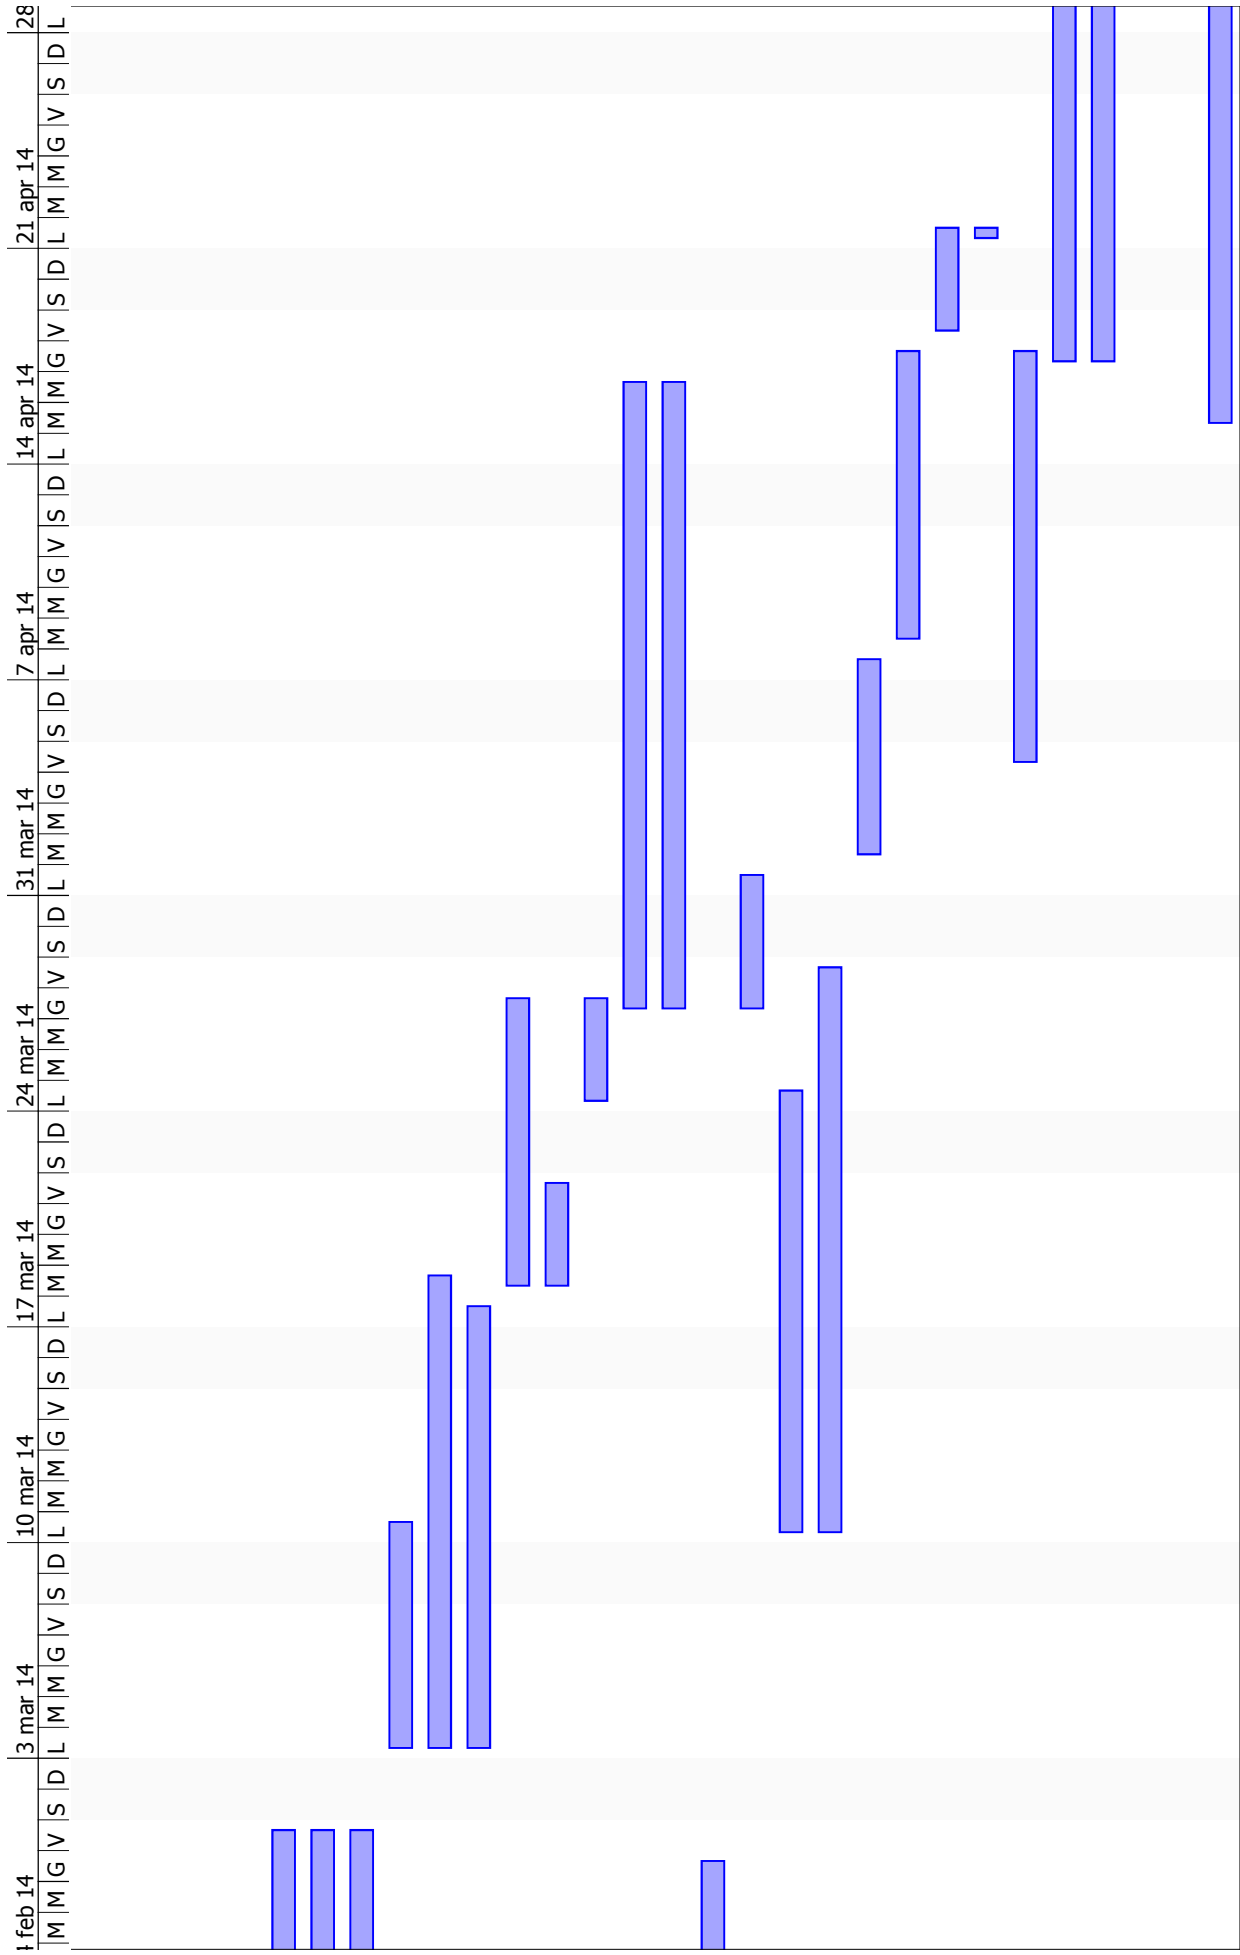



giu 14							7 lug 14							14 lug 14						
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L


Impianto Spegnimenti Incendi ad Idranti ed Autom...

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
31		sistemi antincendio automatici edif. C - elettrici 1	8 days	19/05/14 8.00	28/05/14 17.00	
32		Cartellonistica, etichettature, test, aggiornamento piani...	6 days	27/05/14 8.00	03/06/14 17.00	
33		Verifica sistema rivelazione incendi - precollaudo	3 days	04/06/14 8.00	06/06/14 17.00	
34		Formazione personale	1,25 days	09/06/14 8.00	10/06/14 10.00	
35		IMPREVISTI	7 days	07/06/14 8.00	17/06/14 17.00	

Resource Names	6 gen 14			13 gen 14			20 gen 14			27 gen 14			3 feb 14			10 feb 14			17 feb 14			24									
	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L			

† feb 14	M	M	G	V	S	D	L	3 mar 14	L	M	M	G	V	S	D	L	10 mar 14	L	M	M	G	V	S	D	L	17 mar 14	L	M	M	G	V	S	D	L	24 mar 14	L	M	M	G	V	S	D	L	31 mar 14	L	M	M	G	V	S	D	L	7 apr 14	L	M	M	G	V	S	D	L	14 apr 14	L	M	M	G	V	S	D	L	21 apr 14	L	M	M	G	V	S	D	L	28	L	L	S	V	G	M	M	L
----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---



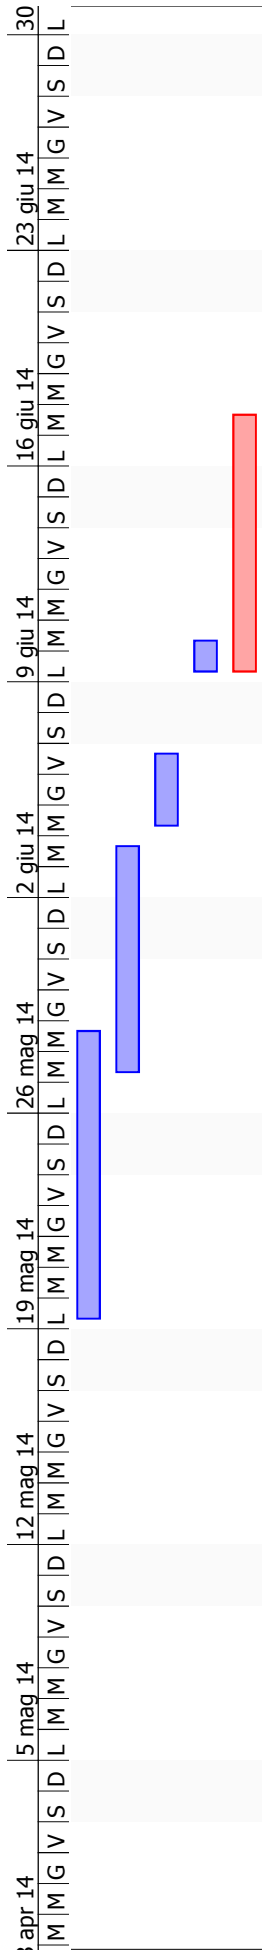

giu 14							7 lug 14							14 lug 14						
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
